

COINFRA Infraestrutura e Energia

INFORME ESTRATÉGICO




Informações sobre obras do DER-ES priorizadas na Etapa 1

O DER-ES forneceu ao Coinfra informações sobre um conjunto de obras que ele priorizou e denominou de Etapa 1. São obras de infraestrutura logística relativas a melhorias em estradas em operação e trechos novos em implantação, dentre outras.

A seguir, uma rápida análise gráfica do estágio em que se encontram as obras.

Em relação ao início do ano, as obras paralisadas caíram em valor de R\$ 136 milhões para R\$ 65 milhões. E aquelas em execução aumentaram, também em valor, de R\$ 599 para R\$ 820 milhões, um crescimento bastante significativo de 37%. Um bom resultado para um ano difícil.

OBRAS DO DER-ES Etapa 1 - R\$ Milhões

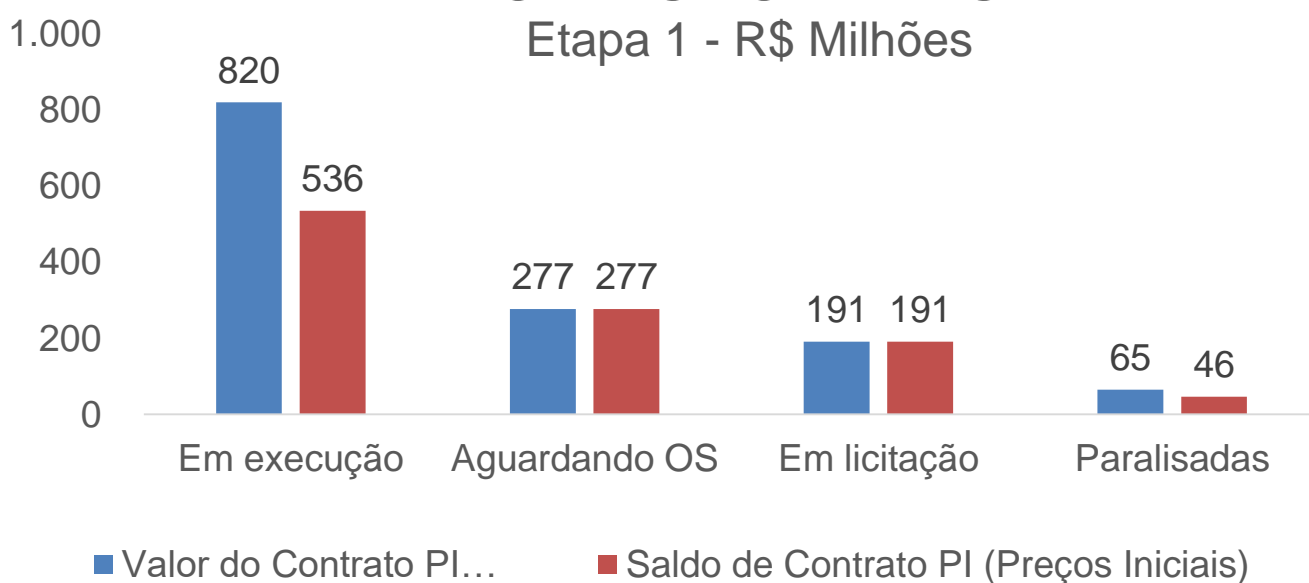

PERCENTUAL DO TOTAL



COINFRA Infraestrutura e Energia

INFORME ESTRATÉGICO



Status de obras de acesso a portos

A seguir um panorama dos projetos e obras relativos aos principais acessos aos portos, através de vias estaduais.

Imp = implantação; Pav = pavimentação e Reab = reabilitação

STATUS DE OBRAS E PROJETOS DE ACESSOS A PORTOS

Objeto	Tipo	Extensão (km)	Avanço Fis. Finan. (%)	Conclusão Previsita	Observação
Aeroporto de Linhares	Imp	2	95%	jan/21	Obra concluída
ES 010, entr. ES 429 - Barra Nova (entr. ES 315)	Imp Pav	10	88%	dez/21	Elaboração de projeto em fase final. Após conclusão será elaborado termo de referência, orçamento, edital para posterior contratação da obra.
ES 440, trecho entr. BR 101/ES 440 - entr. ES 010 (p/ Regência)	Reab Imp Pav	32	30%	fev/22	Elaboração de projeto. Após conclusão será elaborado termo de referência, orçamento, edital para posterior contratação da obra.
ES 124, trecho: Aracruz - entr. BR 101 (Guaraná)	Reab	15	31%	mar/22	Projeto em elaboração.
Contorno de Aracruz (trecho de 11,70 km contornando a cidade)	Imp Pav	30	14%	mar/22	Projeto em elaboração.
ES 257, Aracruz - Entr. BR 101 (Ibiraçu) - Nome do trecho ES 257 (trecho de 11,2 km de Ibiraçu ao Contorno de Aracruz)	Dup	12	15%	mar/22	Projeto em elaboração.

COINFRA

Infraestrutura e Energia

INFORME ESTRATÉGICO



Continuação

STATUS DE OBRAS E PROJETOS DE ACESSOS A PORTOS

ES 162 (BR 101 a Presidente Kennedy)	Reab	34	80%	jul/22	Contrato para elaboração do projeto paralisado. Convênio assinado com a Prefeitura de Presidente Kennedy para retomada dos projetos. Previsão de reinício dos serviços em janeiro/22. Prazo aproximadamente de 6 meses para conclusão.
ES 297 (BR 101 a Presidente Kennedy)	Imp Pav	47	45%	jul/22	Contrato para elaboração do projeto paralisado. Convênio assinado com a Prefeitura de Presidente Kennedy para retomada dos projetos. Previsão de reinício dos serviços em novembro/21. Prazo aproximadamente de 6 meses para conclusão.
ES 010, trecho: Avenida Minas Gerais - Nova Almeida	Imp Pav	9	13%	2023	Obra reiniciada.
ES-060 (Barra do Jucu) – Xuri – entroncamento BR 101 (Amarelos) - Segmento Rural	Imp Pav	17	37%	jul/22	Obra em execução
ES-388, trecho: Entr. ES-060 (Barra do Jucu – km 5,27 (Bairro Santa Paula II) - Segmento Urbano	Pav	5	0%	2023	Licitação concluída. Processo em tramitação para assinatura do contrato. Previsão de início em janeiro/22.

Romeu Rodrigues – Especialista do Coinfra

Gustavo Peters Barbosa – Presidente do Conselho
